

Kanaliseringsanlæg i krydset Moltrup Landevej – Errestedvej



Projektnummer 19/29236

Dato 11.01.2021 udfærdiget af CSH

### **Projektbeskrivelse**

Dette notat beskriver de overordnede rammer for etablering af et kanaliseringsanlæg i krydset mellem Moltrup Landevej og Errestedvej.

1. Kanaliseringsanlæggets geometri udføres som en symmetrisk sideudvidelse omkring vejmidten på Moltrup Landevej.  
Venstresvingsbanen udføres med en bredde på 3,50 m, kørespor 3,25 m, cykelbane 1,30 m og rabatter 2,00 m. Rabatterne afrundes med radius 9 og efterfølgende anlæg 3 skråning til grøftebund. Grøftebund udføres med en bredde på 0,35 m og anlæg 2 bagkant skråning til eksisterende terræn.
2. Markoverkørsler etableres med en bredde på 6,00 m med 2 x 2 meter vinger ved tilslutning til landevejen. Overkørslerne etableres med en belægningsopbygning svarende til, at landbrugskøretøjer kan passere.  
Overkørsel i km. 4.440 genetableres samme sted, overkørsel i km. 4.590 nedlægges og flyttes til km. 4.645, overkørsel i km. 4.615 nedlægges og overkørsel i km. 4.685 som er beliggende udenfor projektområdet skal fremover anvendes som adgang til matrikel nr. 254.
3. På Errestedvej etableres der en sidevejshelle, og ved venstresvingsbanen etableres der midterheller. I den østligste midterhelle etableres der krydsningsmulighed for cyklister, som kommer fra vest på Moltrup Landevej og skal fortsætte ad Errestedvej.  
Krydsningsmuligheden etableres også af hensyn til en eventuel fremtidig dobbeltrettet cykelsti langs sydsiden af Moltrup Landevej.
4. Under udførelsen vil der blive udlagt et arbejdsareal på ca. 10 meter i hele projektets længde.
5. Eksisterende oversigtsarealer på begge sider af Errestedvej nedlægges, og der etableres ikke nye, da oversigterne er beliggende indenfor fremtidig vejareal.
6. Der etableres ny grøfteafvanding i hele projektets længde, som tilsluttes de eksisterende afvandingsforhold umiddelbar udenfor projektområdet.

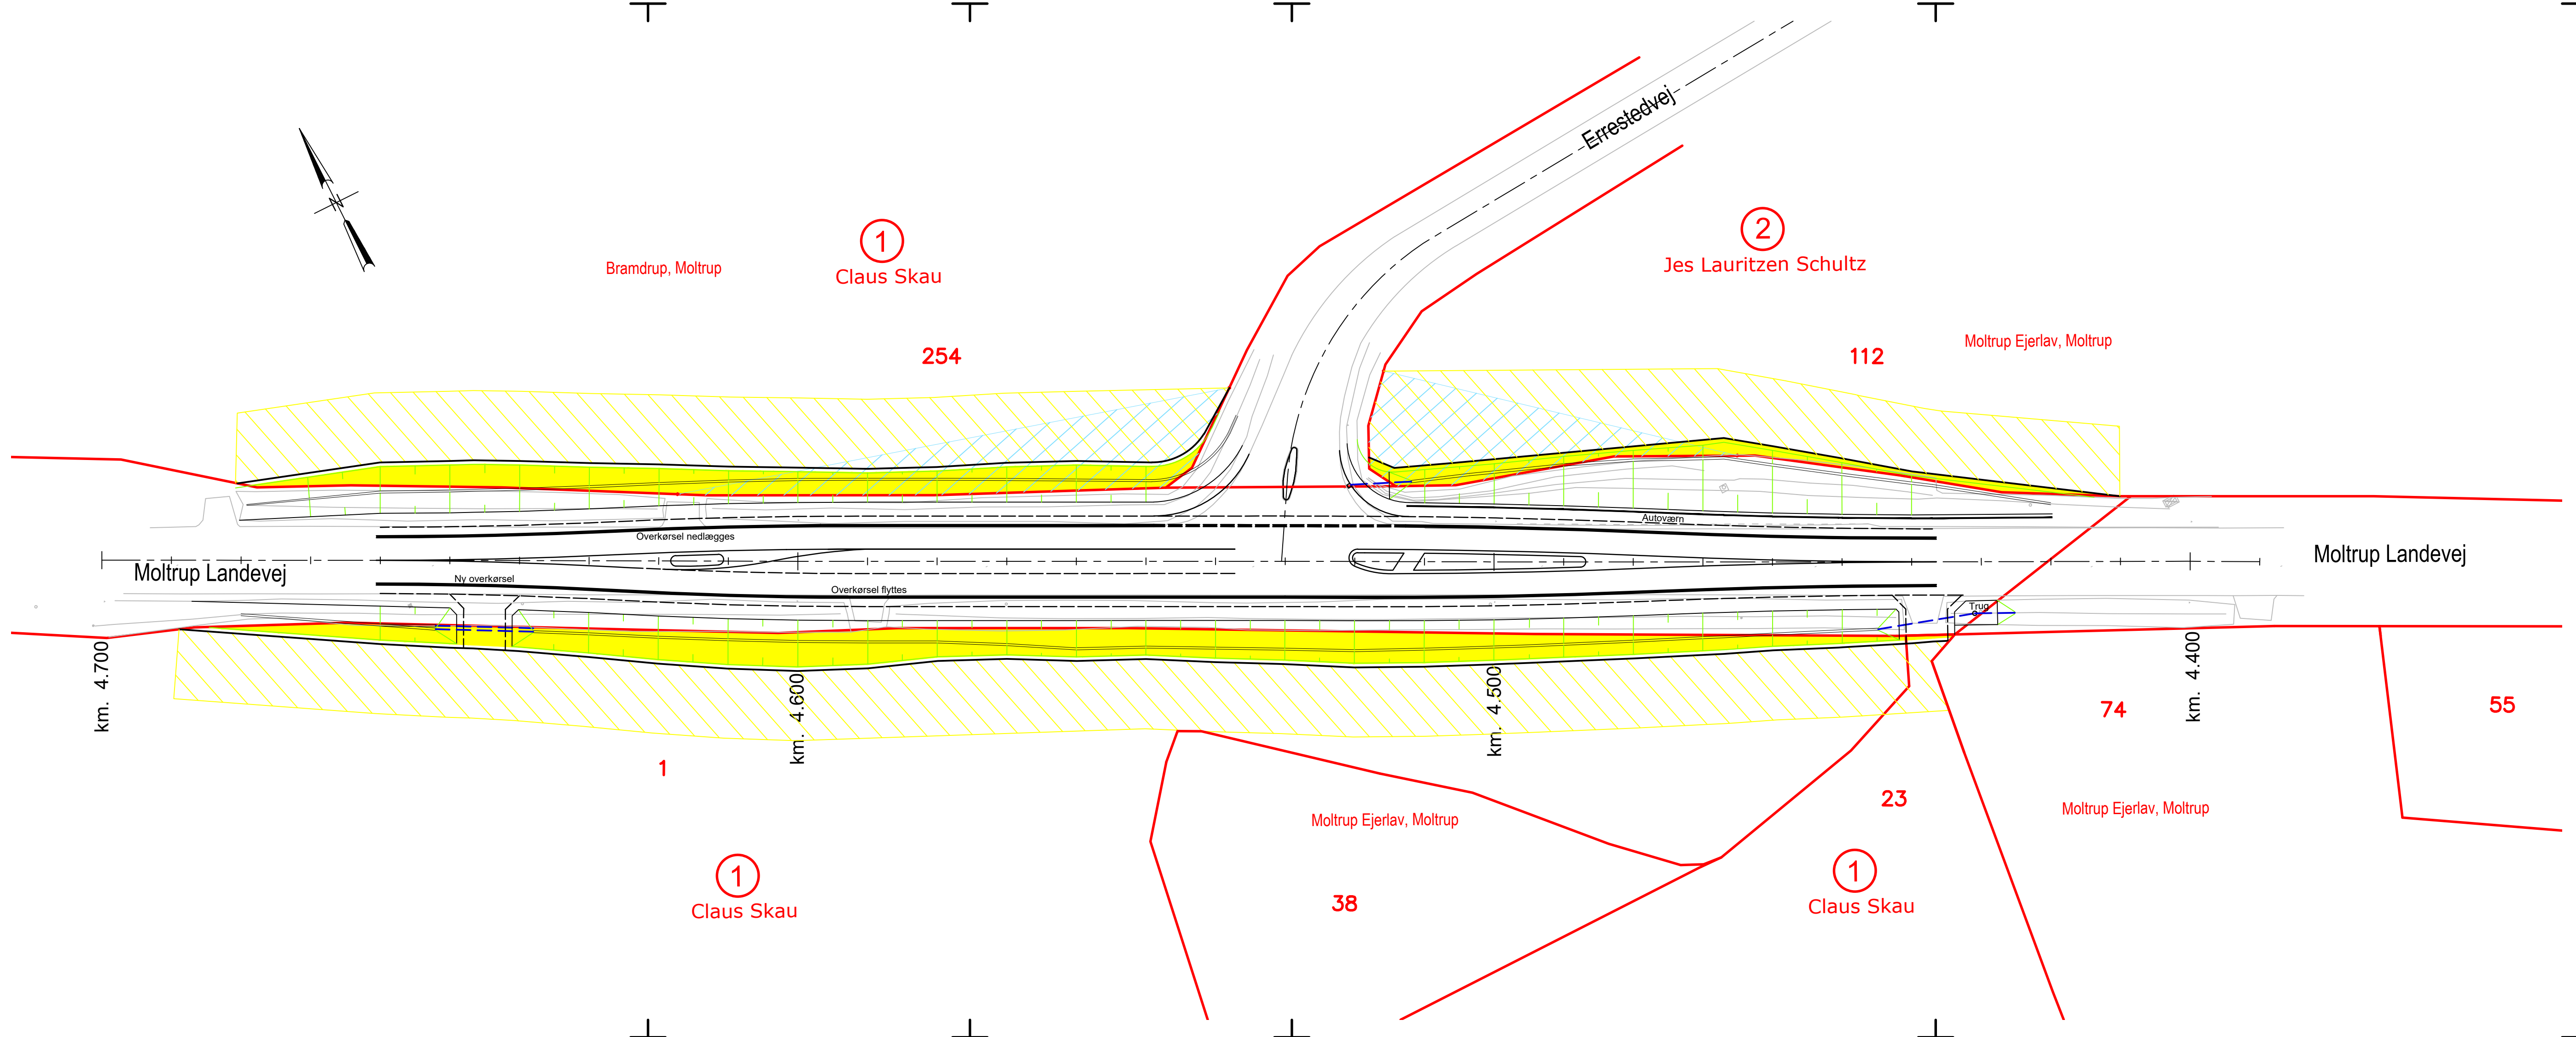

- Areal der erhverves
- Tidligere oversigtsareal der nedlægges
- Arbejdsareal
- Skel mellem lodsejere

Noter:  
Alle koter er DVR90

|   |                       |                         |
|---|-----------------------|-------------------------|
| <b>MOLTRUP LANDEVEJ</b><br>Kanaliseringsanlæg i krydset mellem<br>Moltrup Landevej og Errestedvej<br>Ekspropriationsplan  | Udarbejdet<br>csh     | Tegn. nr.<br><b>101</b> |
|   | Jour. nr.<br>19/29236 | Dato<br>12.11.2020      |
|   | Mål<br>1 : 500        | Revideret               |
| Haderslev Kommune<br>Gåskærgade 26-28<br>6100 Haderslev<br>Tlf. 74 34 34 34<br>mail: post@Haderslev.dk - www.Haderslev.dk |                       |                         |
